

Q&A ไชข้อข้องใจพัสดุ: งานก่อสร้างส่งล่าช้า

ส่งรวมยอด

VS

ส่งแยกงวด

คิดค่าปรับต่างกันอย่างไร?



✦ สัญญาจำลอง (เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน)



วงเงินรวมทั้งสัญญา = 1,000,000 บาท



วันที่ 0

วันที่ 50

วันที่ 100



เริ่มต้น

กำหนดส่งงวดที่ 1

กำหนดส่งงวดที่ 2 /
สิ้นสุดสัญญา

❶ เคสที่ 1: ส่งงาน 'รวมยอด' พร้อมกัน 2 งวด



✅ วิธีหักค่าปรับ (เคสส่งรวมยอด)

เริ่มนับค่าปรับ: วันที่ **101 - 140** (รวม **40 วัน**)



ฐานคิดค่าปรับ: วงเงิน 1,000,000 บาท



เงินค่างวด 1+2




ใบเสร็จค่าปรับ 40 วัน



**หักออกคราวเดียว
ตอนจ่ายเงินรวมยอด!**

หมายเหตุ: ไม่ต้องคิดค่าปรับงวด 1 แยกต่างหาก เพราะเป็นงานที่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน

● เคสที่ 2: ส่งงาน 'แยกวัด' (เลยสัญญาทั้งคู่)

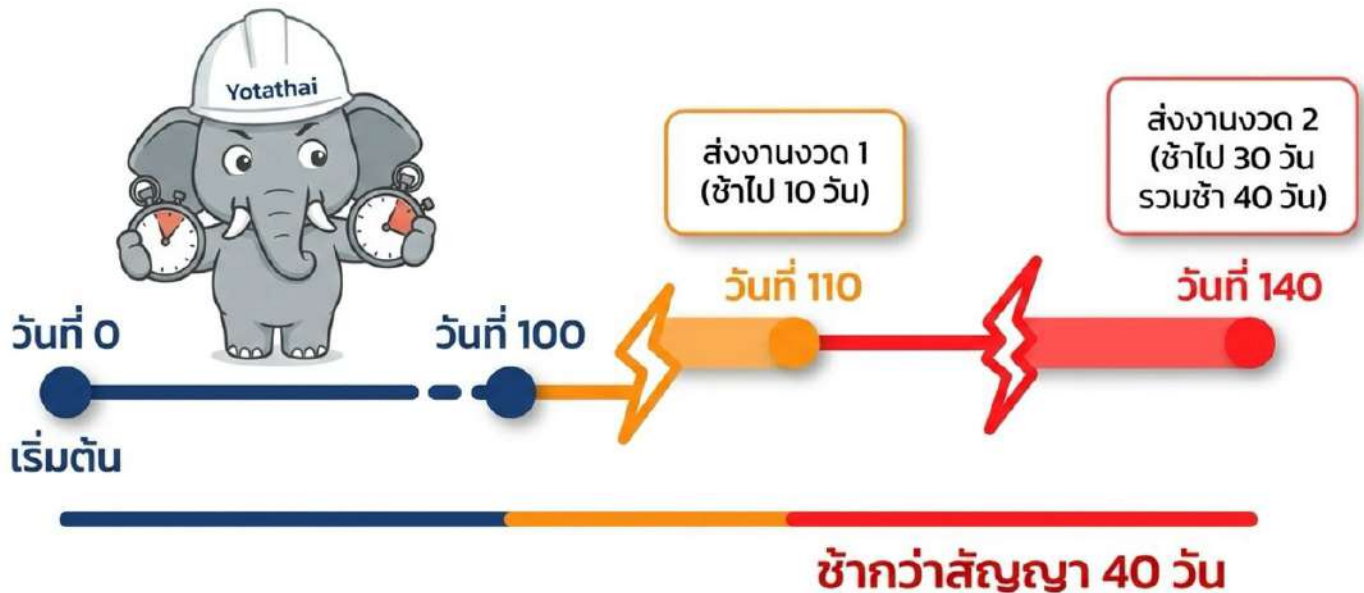

✓ วิธีหักค่าปรับ (ต้องแบ่งหัก 2 ช่วง!)



สรุปเปรียบเทียบให้เห็นภาพ



	รวมยอด	แยกงวด
การส่งงาน	วันที่ 140 (งวด 1+2)	วันที่ 110 (งวด 1) และ วันที่ 140 (งวด 2)
การนับวันปรับ	รวม 40 วัน (วันที่ 101-140)	10 วัน (ช่วงแรก) + 30 วัน (ช่วงหลัง)
ฐานคำนวณ	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท เสมอ!
จังหวะหักเงิน	หักครั้งเดียวตอนจบ รวมยอด	แบ่งหักทันทีทุกครั้งที่ จ่ายเงินค่างวด

💡 3 กฎเหล็ก (Golden Rules) ที่ห้ามพลาด!

1



ฐานปรับไม่เปลี่ยน: คิดจาก
วงเงินรวมทั้งสัญญาเสมอ (1 ล้านบาท)

2



เกิดปรับเมื่อไหร่ หักเมื่อนั้น:
เบิกเงินงวดไหน หักค่าปรับออกจากงวดนั้นทันที!

3



เตือนทันทีที่ผิดนัด:
แม้งวดแรกจะยังไม่รับ แต่เลยกำหนดเมื่อไหร่ **ต้องมี**
หนังสือแจ้งเตือนเร่งรัด **ทันที** เพื่อรักษาสีตราราชการ!



เซฟเก็บไว้ หรือแชร์ให้เพื่อนร่วมงานได้เลย! 🧑🏻💻🌟
