

การทำความเข้าใจความแตกต่าง คือหัวใจของการปฏิบัติตามระเบียบและสร้างความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 NotebookLM

จุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน: อะไรคือสาเหตุที่ต้องปรับปรุงราคากลาง?



การทบทวน (Review)

เมื่อราคากลาง **หมดอายุเกิน 30 วัน**
นับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
และยังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดจ้าง



การแก้ไข (Correction)

เมื่อตรวจพบ **ข้อผิดพลาด**
ในการคำนวณราคากลางเดิม
(เช่น ปริมาณงานใน BOQ ผิด,
ใช้ราคาวัสดุหรือค่าแรงผิด)

หัวใจของความแตกต่าง: เป้าหมายและชุดข้อมูลราคาที่ใช้

การทบทวนราคากลาง

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อปรับปรุงราคาให้เป็น **ปัจจุบัน**

ข้อมูลราคาที่ใช้ (Data Used)

ต้องใช้ ข้อมูลราคาวัสดุที่เป็นปัจจุบันล่าสุด
ณ ช่วงเวลาที่คำนวณราคากลางใหม่

การแก้ไขราคากลาง

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อให้ได้ราคากลางที่
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ข้อมูลราคาที่ใช้ (Data Used)

ต้องอ้างอิง ข้อมูลราคากลาง 'เดิม'
ที่อนุมัติไว้ก่อนวันขายของ
(ห้ามเปลี่ยนเป็นราคาปัจจุบัน)

ตารางเปรียบเทียบ: การทบทวน vs. การแก้ไขราคากลาง

ประเด็นเปรียบเทียบ	1. การทบทวนราคากลาง	2. การแก้ไขราคากลาง (ตาม ว.651)
สาเหตุหลัก	อายุราคากลาง ' เกิน 30 วัน ' และยังไม่ จัดจ้าง	พบ ' ข้อผิดพลาด ' ในการคำนวณ (เช่น ปริมาณ BOQ ผิดพลาด, ราคาวัสดุผิด)
วัตถุประสงค์หลัก	ปรับปรุงราคา ให้เป็นปัจจุบัน	จัดทำราคากลางใหม่ ให้ถูกต้องตามจริง
ข้อมูลราคาที่ใช้	ใช้ ข้อมูลราคาที่เป็นปัจจุบันล่าสุด	อ้างอิง ข้อมูลราคากลาง 'เดิม' (ห้ามเปลี่ยน)
ช่วงเวลาดำเนินการ	ก่อน ประกาศประกวดราคา	เมื่อพบข้อผิดพลาด (แม้ในขั้นตอนจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา)
ผลลัพธ์ของราคา	ได้ราคากลางใหม่ที่สะท้อนราคาตลาดล่าสุด	ได้ราคากลางที่สะท้อนราคา ณ วันที่ขายของ ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน

เจาะลึก: กระบวนการ 'แก้ไข' ราคากลางเมื่อพบข้อผิดพลาด (ตามแนวทาง ว.651)

เมื่อแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ)
คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ทำให้ราคากลางที่กำหนดไว้ต่ำหรือสูงเกินจริง

คณะกรรมการฯ ต้องจัดทำราคากลางใหม่ให้ถูกต้อง
เพื่อใช้เป็นราคาเปรียบเทียบ



Critical Principle

**'ห้ามเปลี่ยนชุดข้อมูลราคา
กลางให้เป็นปัจจุบัน'**

การแก้ไขจะต้องอ้างอิงข้อมูล
ราคากลาง **'เดิม'** ที่อนุมัติไว้
ก่อนวันขายซองเท่านั้น

ข้อควรระวังในการแก้ไข: การปรับลดราคาในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ตามแนวทาง ว.651 การแก้ไขราคากลางที่ผิดพลาดจะนำไปสู่การปรับราคาในสัญญา


หน่วยงานของรัฐต้อง **ปรับราคาทุกรายการ*** ในแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจ้างครั้งนั้น



ยกเว้นรายการที่ไม่ต้องปรับลดราคา:

- 'ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด' (Special expenses as per specifications) *

บทสรุปเพื่อการตัดสินใจ: จันควร 'ทบทวน' หรือ 'แก้ไข'?

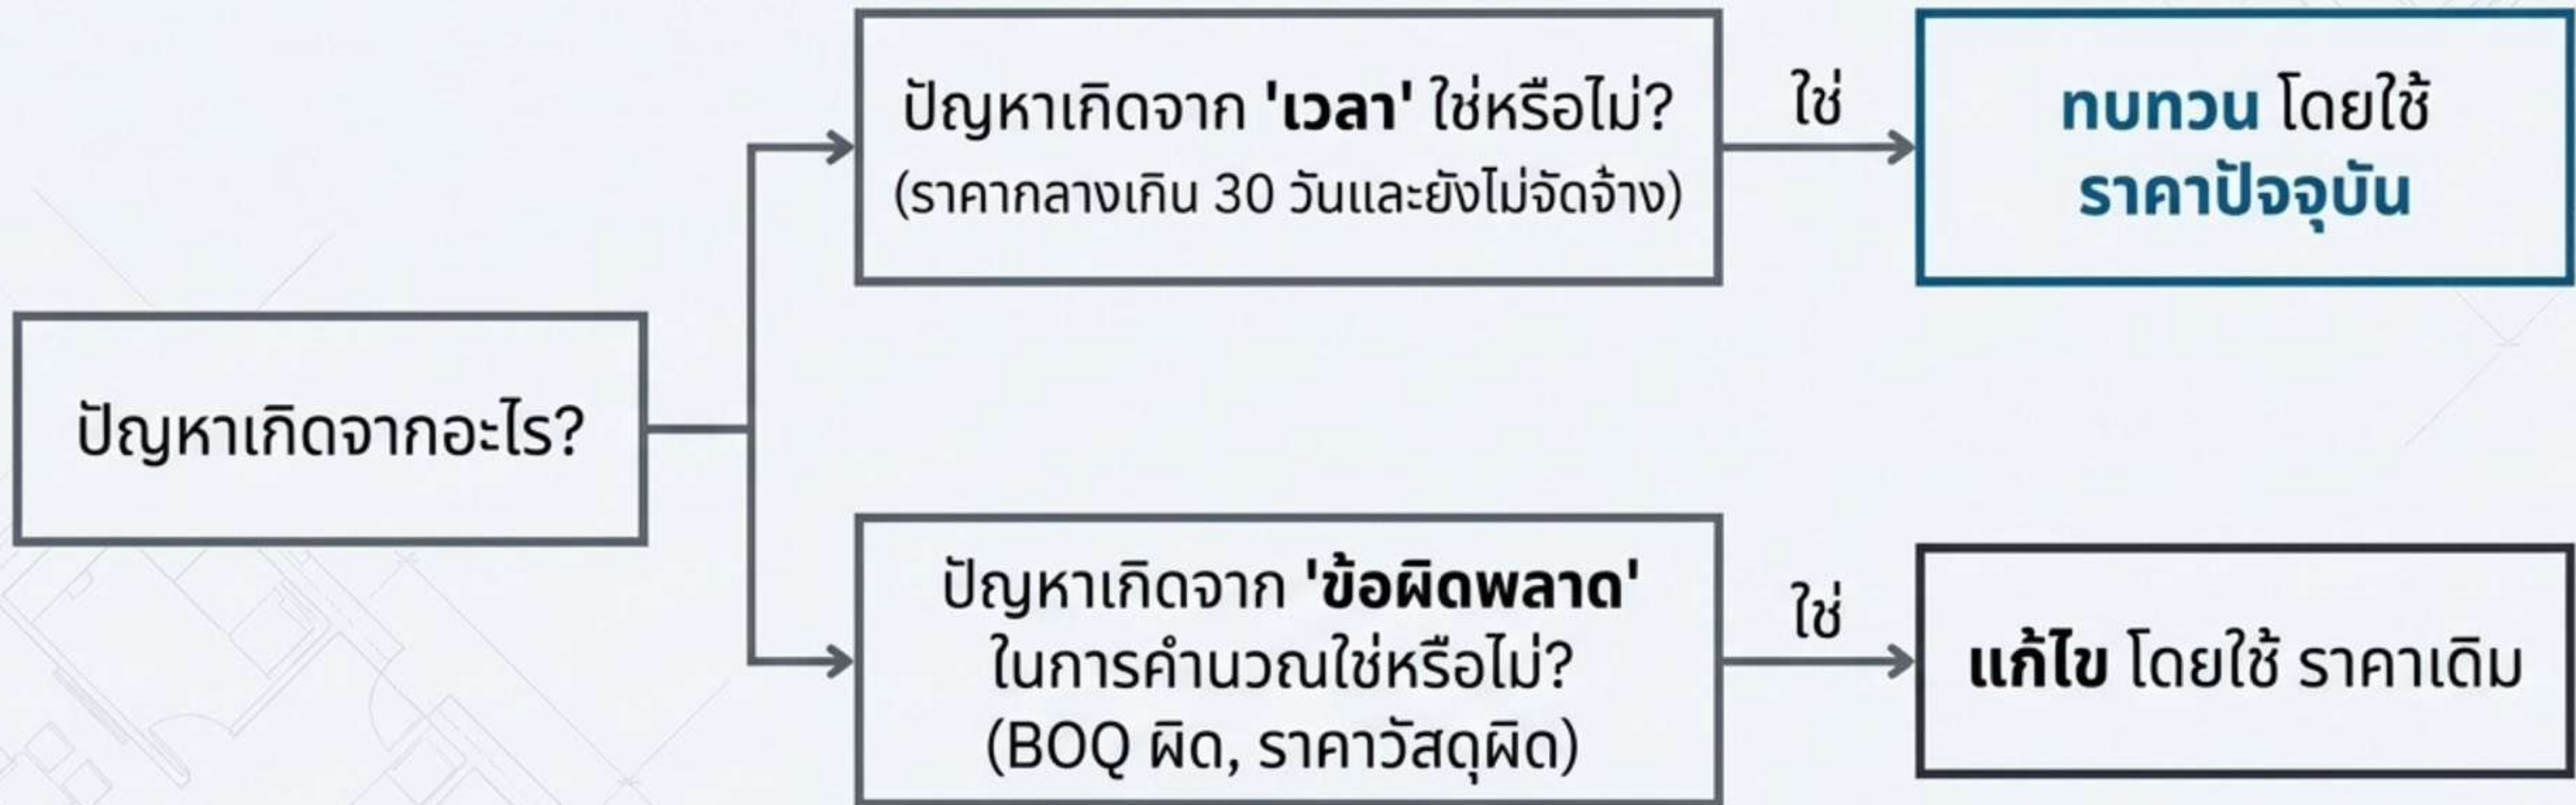

ราคากลางที่ถูกต้อง คือรากฐานของความโปร่งใส

การเลือกระหว่าง 'การทบทวน' และ 'การแก้ไข' อย่างถูกต้อง
ไม่ใช่แค่เรื่องของระเบียบ แต่คือการรักษาความน่าเชื่อถือ
และความเป็นธรรมของโครงการก่อสร้างภาครัฐ

จัดทำโดย YOTATHAI
