



ค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 162



$$\text{ค่าปรับ} = \text{อัตราค่าปรับ} \times \text{มูลค่าของสัญญา หรือข้อตกลง / ราคาพัสดุ ที่ยังไม่ได้รับมอบ} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด}$$

ประเภท	อัตรา
1. การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา	ร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2. การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกัน	ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท
3. งานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร	ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง
4. กรณีจ้างที่ปรึกษา	ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง

$$\text{ค่าปรับ} = \text{อัตราค่าปรับ} \times \text{มูลค่าของสัญญา หรือข้อตกลง / ราคาพัสดุ ที่ยังไม่ได้รับมอบ} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด}$$

ประเภท	มูลค่า
1. การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา	ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2. การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกัน	ปรับเต็มมูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง (เช่น กรณีการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดพร้อมกัน หรือ การจัดหาสิ่งของที่ประกอบ กันเป็นชุด)
3. งานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร	
4. กรณีจ้างที่ปรึกษา	


ภาพประกอบ : จาก VDO เผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง



การคำนวณค่าปรับ กรณีงานก่อสร้าง



- ตัวอย่างที่ 1
- วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ
- กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

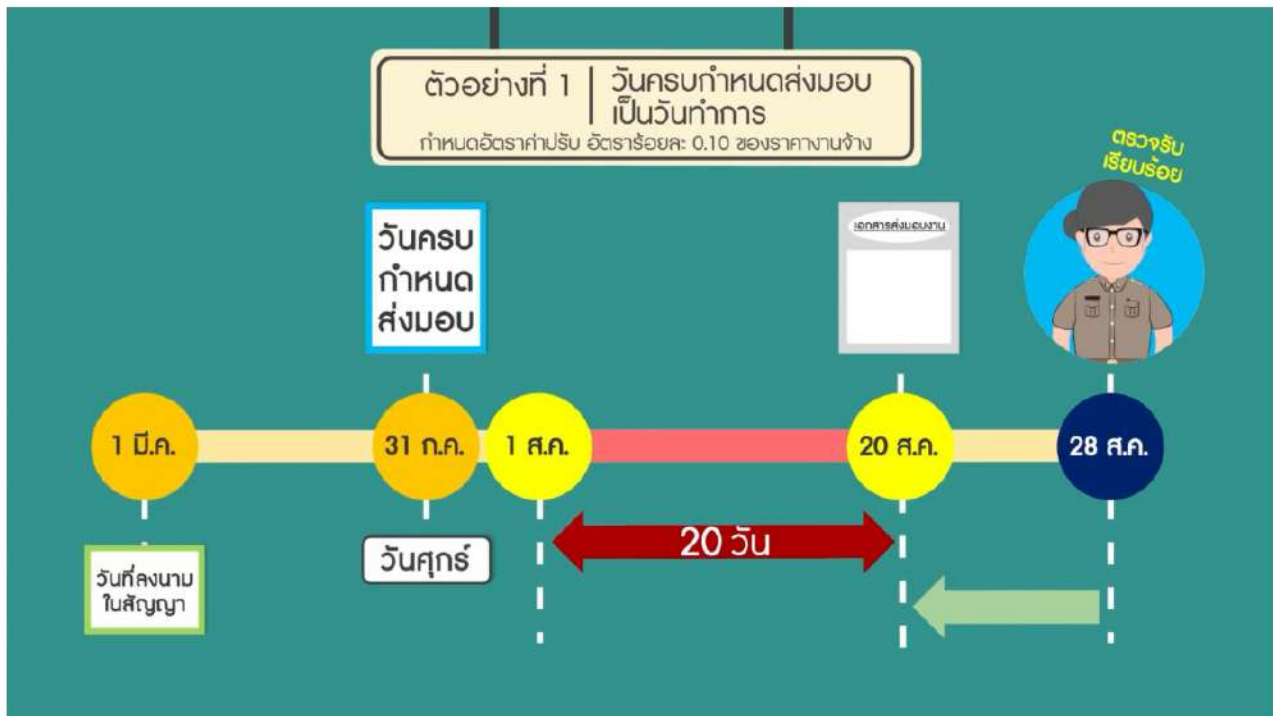

การคิดค่าปรับ

$$\text{อัตราค่าปรับ(\%)} \times \text{มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด}$$

$$0.10\% \times 2,000,000 \text{ บาท} \times 20 \text{ วัน}$$

$$= 40,000 \text{ บาท}$$






การคำนวณค่าปรับ กรณีงานก่อสร้าง



- ตัวอย่างที่ 2
- วันครบกำหนดส่งมอบ เป็นวันหยุด
- กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

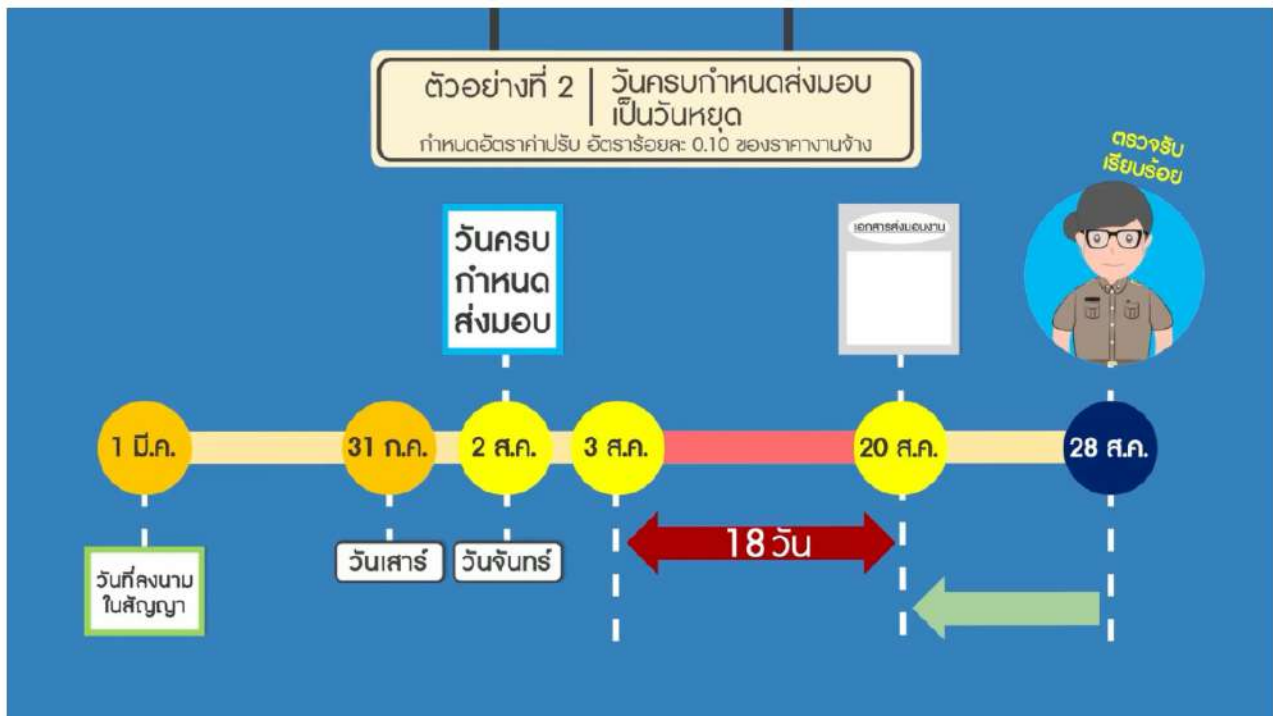

การคิดค่าปรับ

อัตราค่าปรับ(%)

0.10%

มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง

2,000,000 บาท

จำนวนวันที่ผิดนัด

18 วัน

= 36,000 บาท






การคำนวณค่าปรับ กรณีงานก่อสร้าง



- ตัวอย่างที่ 3
- ส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบ เป็นวันทำการ
- กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

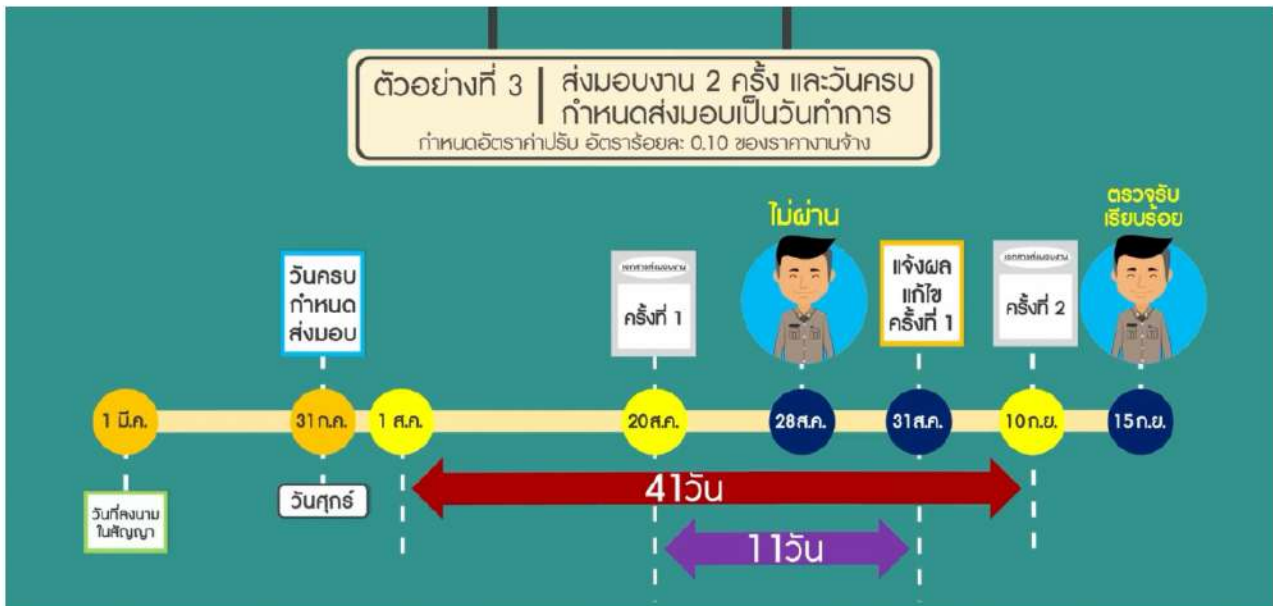

$$\begin{array}{c} \text{จำนวนวันที่ผิดนัด} \\ 41\text{วัน} \end{array} - \begin{array}{c} \text{ระยะเวลาที่} \\ \text{คณะกรรมการตรวจรับ} \\ 11\text{วัน} \end{array} = \begin{array}{c} \text{จำนวนวัน} \\ \text{ที่นำไปคำนวณค่าปรับ} \\ 30\text{วัน} \end{array}$$

การคิดค่าปรับ

$$\begin{array}{c} \text{อัตราค่าปรับ(\%)} \\ 0.10\% \end{array} \times \begin{array}{c} \text{มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง} \\ 2,000,000 \text{ บาท} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{จำนวนวันที่ผิดนัด} \\ 30 \text{ วัน} \end{array} = 60,000 \text{ บาท}$$


ภาพประกอบ : จาก VDO เผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง



การคำนวณค่าปรับ กรณีงานก่อสร้าง



- ตัวอย่างที่ 4
- ส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบ เป็นวันหยุด
- กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

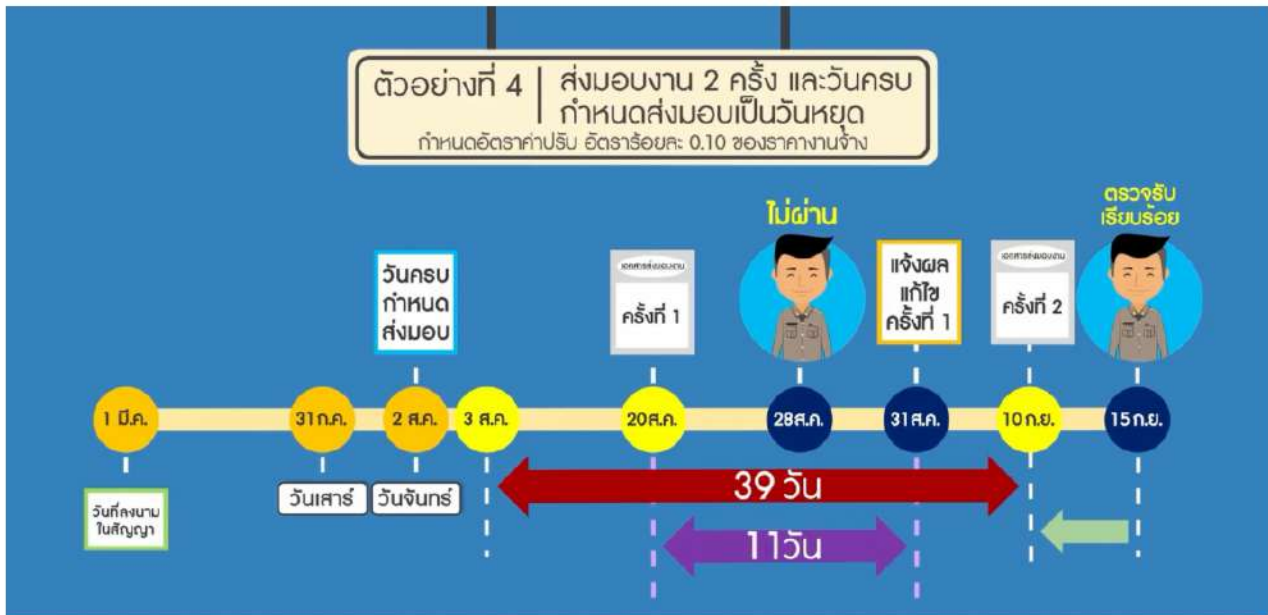

$$\begin{array}{ccc} \text{จำนวนวันที่ผิดนัด} & - & \text{ระยะเวลาที่คณะกรรมการการตรวจรับ} \\ \mathbf{39 \text{ วัน}} & - & \mathbf{11 \text{ วัน}} \\ & = & \mathbf{28 \text{ วัน}} \end{array}$$

จำนวนวันที่ผิดนัด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการการตรวจรับ
จำนวนวันที่นำไปคำนวณค่าปรับ

การคิดค่าปรับ

$$\begin{array}{ccccc} \text{อัตราค่าปรับ(\%)} & & \text{มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง} & & \text{จำนวนวันที่ผิดนัด} \\ \mathbf{0.10\%} & \times & \mathbf{2,000,000 \text{ บาท}} & \times & \mathbf{28 \text{ วัน}} \\ & & & & \\ & & & & \mathbf{= 56,000 \text{ บาท}} \end{array}$$


ภาพประกอบ : จาก VDO เผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง



การคำนวณค่าปรับ กรณีงานก่อสร้าง



- ตัวอย่างที่ 5
- ส่งมอบงานครั้งที่ 1 ก่อนกำหนดส่งมอบ
- ส่งมอบงานครั้งที่ 2 หลังกำหนดส่งมอบ
- กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

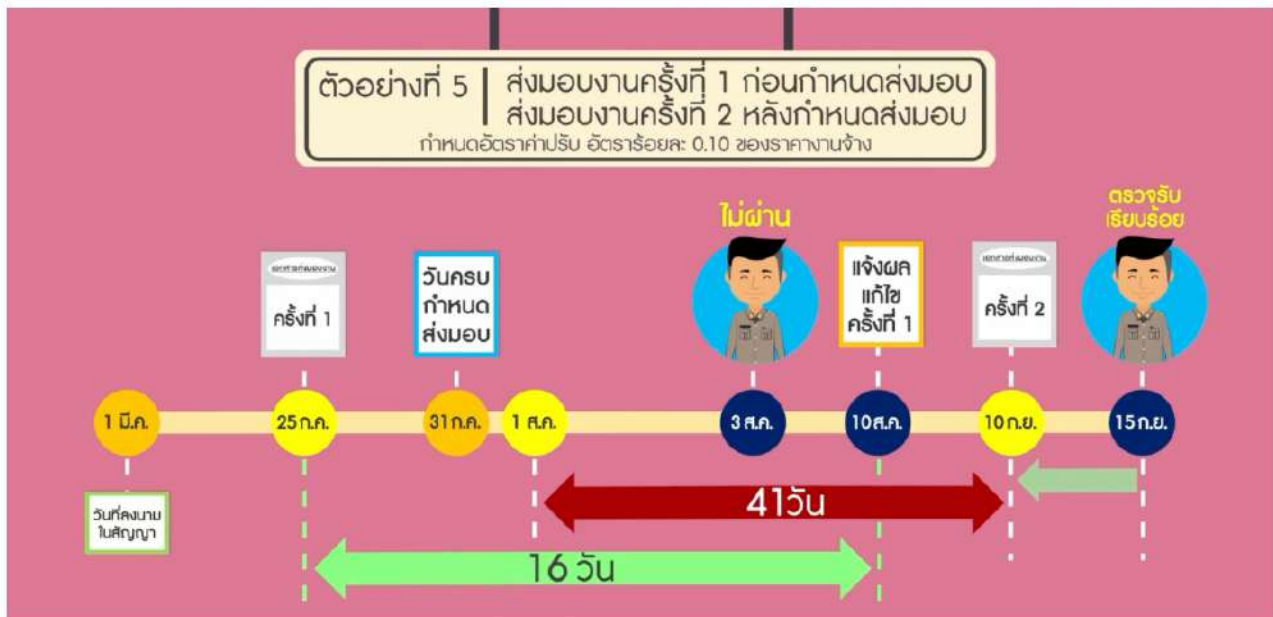

$$\text{จำนวนวันที่ผิดนัด} - \text{ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ} = \text{จำนวนวันที่นำไปคำนวณค่าปรับ}$$

$$41 \text{ วัน} - 16 \text{ วัน} = 25 \text{ วัน}$$

การคิดค่าปรับ

$$\text{อัตราค่าปรับ(\%)} \times \text{มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด}$$

$$0.10\% \times 2,000,000 \text{ บาท} \times 25 \text{ วัน}$$

$$= 50,000 \text{ บาท}$$

ภาพประกอบ : จาก VDO เผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง
